



# Prikaz Izveštaja o realizaciji kapitalnog budžeta Crne Gore za treći kvartal 2024. godine

Povodom donošenja Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu<sup>1</sup>, Skupština Crne Gore donijela je [Zaključak](#)<sup>2</sup>, kojim zadužuje Vladu Crne Gore da kvartalno izvještava Skupštinu Crne Gore o stepenu izvršenosti i aktivnostima koje se sprovode na realizaciji kapitalnog budžeta definisanog Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu.<sup>3</sup>


Budžetom Crne Gore za 2024. godinu<sup>4</sup>, za kapitalni budžet opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 237,01 mil.€<sup>5</sup>. Sredstva su opredijeljena za realizaciju 332 projekta (aktivnosti).

Imajući u vidu da je za izgradnju dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice ugovoren kreditni aranžman, koji podrazumijeva značajan iznos donacija, te da je započet postupak tenderskih procedura po pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), opredijeljeni iznos za avansno plaćanje odabranom izvođaču radova (10% od ugovorene vrijednosti), koji je prvobitnim Zakonom o budžetu planiran na iznos od 50 mil.€ neće biti potreban do kraja godine. Rebalansom budžeta za 2024. godinu, izvršena je realokacija sredstava potrebnih za realizaciju drugih kapitalnih projekata, čija se dinamika odvija brže od planirane dinamike potrošnje.


U prvih devet mjeseci 2024. godine za realizaciju kapitalnog budžeta Crne Gore potrošeno je **110,91 mil.€** ili **47% od ukupno planiranog iznosa**. Od navedenog iznosa 15,71 mil.€ je plaćeno iz kredita, a 8,09 mil.€ iz EU donacija (IPA projekti).

U istom periodu 2023. godine, plaćeno je 96,8 mil.€, odnosno 14,10 mil.€ manje; što je činilo 48% od ukupno planiranog iznosa.

U nastavku su grafici koji se odnose na izvršenje kapitalnog budžeta u prvih devet mjeseci 2024. godine i poređenje kapitalnog budžeta u odnosu na isti period 2023. godine:

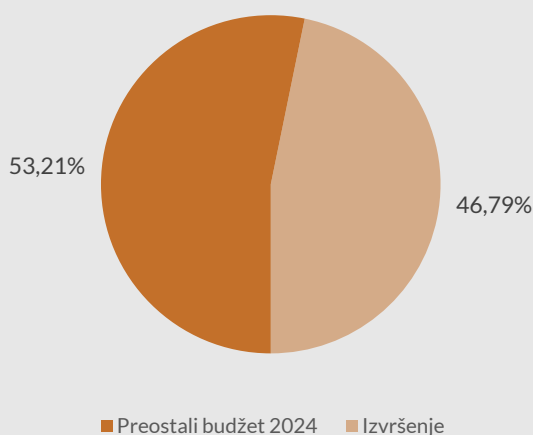

Pita grafik 1 – Odnos planirane i izvršene vrijednosti - stepen realizacije kapitalnog budžeta (%)

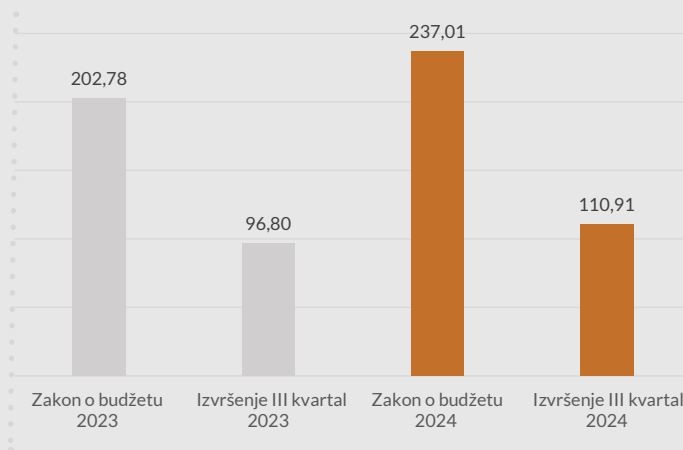

Grafik 2 – Izvršenje kapitalnog budžeta u prvih devet mjeseci u 2023. i 2024. godini (u mil. eur.)

1 „Službeni list Crne Gore”, br. 124/23


2 „Službeni list Crne Gore”, br. 124/23; Zaključci broj 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 16 i 17 odnose se na kapitalni budžet.

3 Prvobitni Izveštaj o realizaciji kapitalnog budžeta Crne Gore za treći kvartal 2024. godine dostavljen je Odboru za ekonomiju, finansije i budžet 18. 11 2024. godine (klas. br: 00-63-7/24-113/1). Korigovani Izveštaj dostavljen je 25. 11. 2024. godine (klas. br: 00-63-7/24-113/2).

4 **Zakon o budžetu Crne Gore za 2024. godinu „Službeni list Crne Gore”, br. 124/23, 086/24, odnosno opredijeljena sredstva nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu (Rebalansa)**. Rebalansom budžeta, za kapitalni budžet su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 237.012.958,82€, što je za 3 mil.€ manje nego inicijalnim Zakonom. Navedeno umanjeno se odnosi na projekte sa potprograma 13 025 K01 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane za potrebe plaćanja ugovorene vojne opreme (patrolnih brodova), u cilju dostizanja NATO standarda od minimalnog izdvajanja za odbranu od 2% BDP-a.



U nastavku je grafik koji se odnosi na izvor finansiranja kapitalnog budžeta u prvih devet mjeseci 2024. godine:

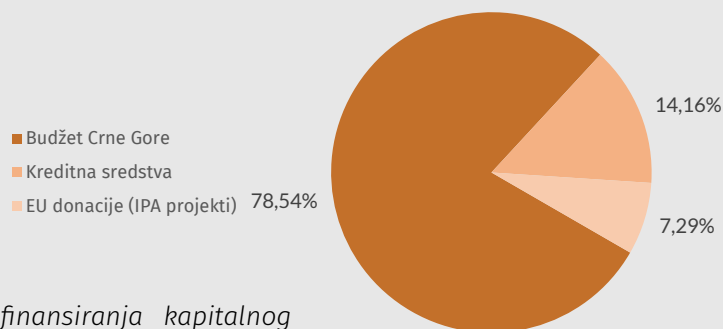


Pita grafik 3 – Izvor finansiranja kapitalnog budžeta u prvih devet mjeseci u 2024. godini (u %)

U prvih devet mjeseci 2024. godine, iz opštih prihoda budžeta je izvršeno 37% planiranih sredstava, sa sredstvima predviđenim za izgradnju Autoputa. Ukoliko se iz planiranih sredstava izuzmu sredstva predviđena za Autoput, stepen izvršenja iz opštih prihoda budžeta je 44%. U uporednom periodu 2023. godine, iz opštih prihoda budžeta bilo je izvršeno 40% planiranih sredstava, sa sredstvima predviđenim za izgradnju Autoputa. Ukoliko se iz planiranih sredstava izuzmu sredstva predviđena za Autoput, stepen izvršenja iz opštih prihoda budžeta u istom periodu 2023. godine iznosio je 39%.

• Ugovorena vrijednost projekata u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosi 27,75% procijenjene vrijednosti projekata:

Grafik 4 – Procijenjena i ugovorena vrijednost projekata (u eur.)

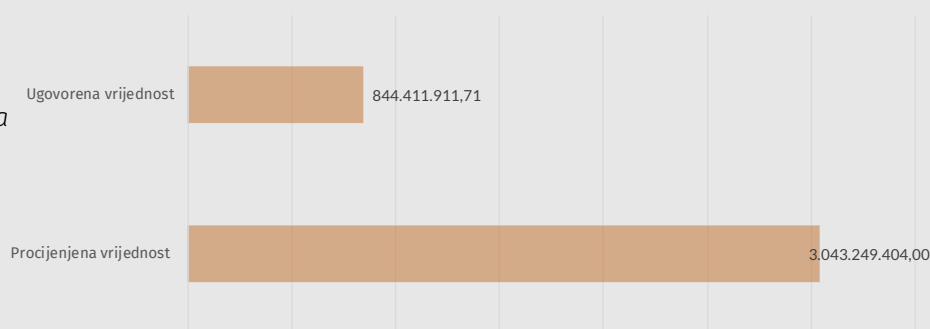


Kapitalni budžet Crne Gore realizuje se preko **Uprave za kapitalne projekte** i **Uprave za saobraćaj**.

U okviru kapitalnog budžeta **Uprave za kapitalne projekte**, budžetom za 2024. godinu, za sprovođenje 254 projekta (aktivnosti) opredijeljeno je 121,3 mil.€, što predstavlja 51% ukupnog kapitalnog budžeta za 2024. godinu.


U prvih devet mjeseci 2024. godine za projekte koji se realizuju preko Uprave za kapitalne projekte **plaćeno je 66,46 mil.€, odnosno 55% ukupno planirane sume**. Iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 55,57 mil.€ ili 46% od ukupno planiranih sredstava, dok je iz kredita plaćeno 2,80 mil.€, a iz EU donacija 8,09 mil.€ (IPA projekti). U istom periodu 2023. godine, plaćeno je 56,69 mil.€, ili 42% od planiranih sredstava.



U nastavku su grafici koji se odnose na izvršenje budžeta Uprave za kapitalne projekte u prvih devet mjeseci 2024. godine i poređenje u odnosu na isti period 2023. godine:

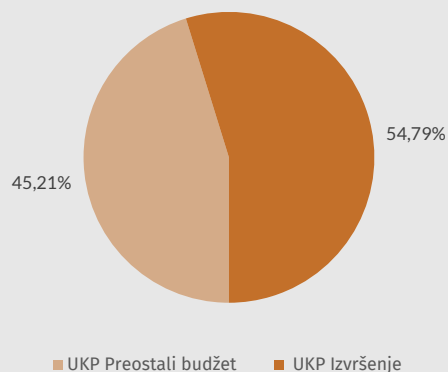

Pita grafik 5 – Stepen realizacije budžeta Uprave za kapitalne projekte (%)

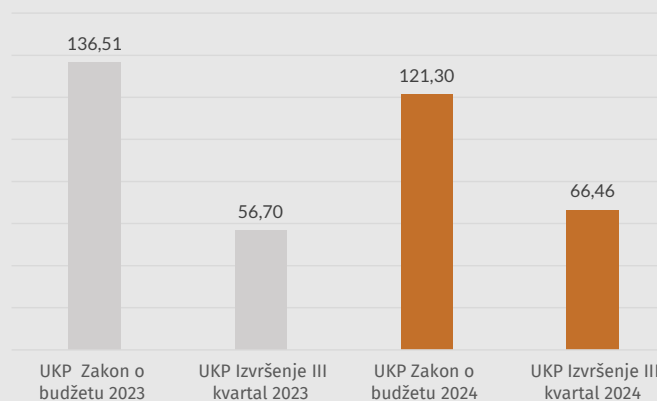


Grafik 6 – Izvršenje budžeta UKP u prvih devet mjeseci u 2023. i 2024. godini (u mil. eur.)


U okviru budžeta **Uprave za saobraćaj**, budžetom za 2024. godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 115,7 mil.€, što predstavlja 49% ukupnog kapitalnog budžeta za 2024. godinu. Za 77 projekata (aktivnosti) ove uprave opredijeljeno je 75,47 mil.€, dok je za Autoput Bar-Boljare, dionica Mateševo – Andrijevića opredijeljeno 40,24 mil.€.

U prvih devet mjeseci 2024. godine, **plaćeno je 44,45 mil.€, odnosno 38% od ukupno planirane sume.** Od navedenog, iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 31,53 mil.€, ili 71% od ukupno planiranih sredstava, dok je iz kredita plaćeno 12,92 mil.€. U istom periodu 2023. godine, plaćeno je 40,11 mil.€, ili 61% planiranih sredstava.

U nastavku su grafici koji se odnose na izvršenje budžeta Uprave za saobraćaj u prvih devet mjeseci 2024. godine i poređenje u odnosu na isti period 2023. godine:

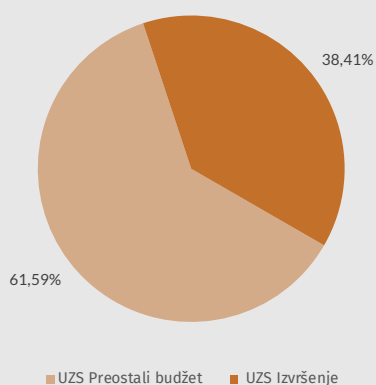

Pita grafik 7 – Stepen realizacije budžeta Uprave za saobraćaj (%)

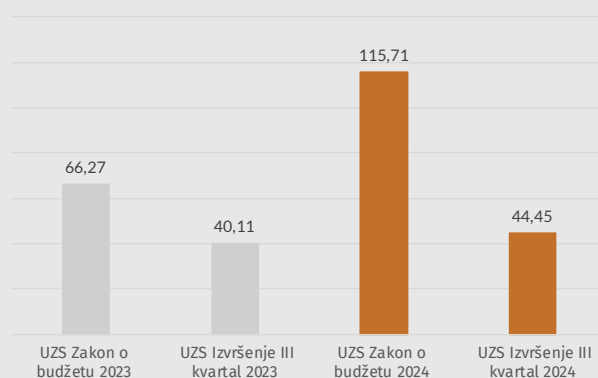

Grafik 8 – Izvršenje budžeta UZS u prvih devet mjeseci u 2023. i 2024. godini (u mil. eur.)


Ukoliko se izuzmu planirana (40,24 mil.€) i plaćena (1,29 mil.€) sredstva za Autoput, izvršenje kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj iz opštih prihoda budžeta je 30,24 mil.€, što je na nivou od 40% od planiranog iznosa za ostale projekte mimo Autoputa.



## Autoput Bar-Boljare


U dijelu koji se odnosi na nastavak realizacije izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Mateševo - Andrijevića, aktivnosti utvrđenom dinamikom sprovodi „Monteput“ DOO, shodno Zakonu o budžetu za 2024. godinu i sporazumima sa Upravom za saobraćaj i Ministarstvom saobraćaja. „Monteput“ DOO je završio pretkvalifikacioni proces za izgradnju druge dionice od Mateševa do Andrijevice u skladu sa procedurama finansijera EBRD-a. Na osnovu evaluacije Komisije definisana je lista od pet kompanija i tri konzorcijuma koji su prošli pretkvalifikaciju, te se za iste čeka odobrenje EBRD-a, nakon čega će uslijediti poziv za dostavljanje ponuda.

U nastavku je grafik koji se odnosi na izvršenje budžeta predviđenog za Autoput u prvih devet mjeseci 2024. godine i poređenje u odnosu na isti period 2023. godine:

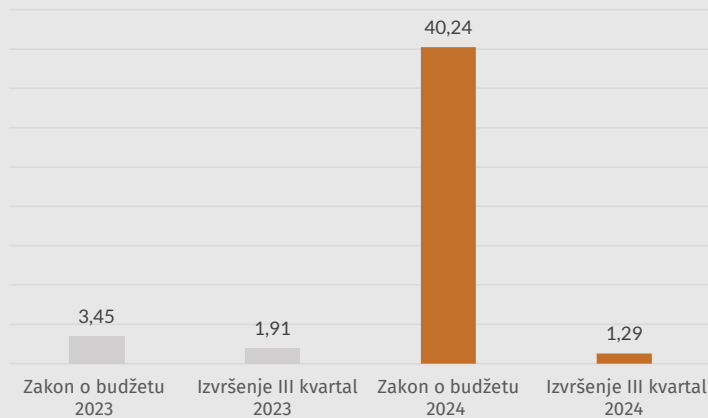

Grafik 9 – Izvršenje budžeta predviđenog za Autoput u prvih devet mjeseci 2023. i 2024. godine (u mil. eur.)

U nastavku je prikazan trend koji pokazuje planirani - izvršeni kapitalni budžet Crne Gore (u mil. eur.):

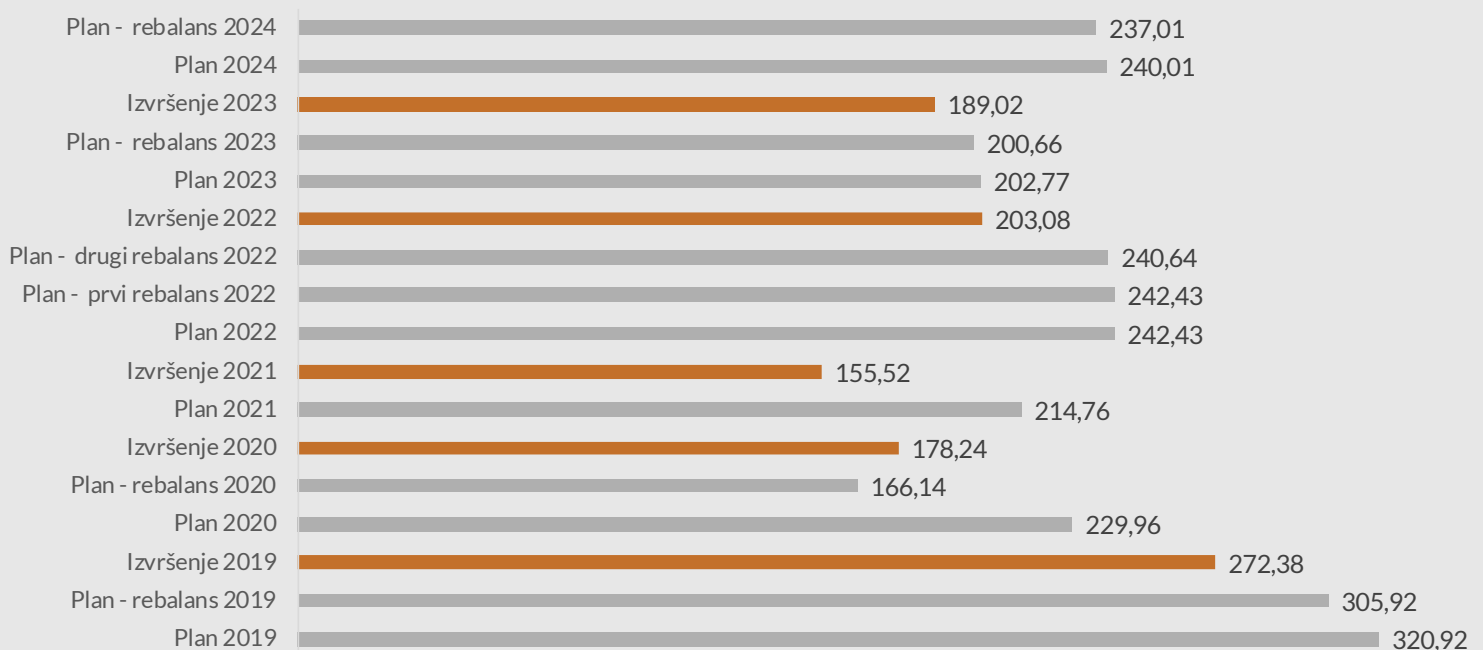

Grafik 10 – Trend planirani - izvršeni kapitalni budžet Crne Gore (u mil. eur.)



U nastavku je prikazano izvršenje sredstava kapitalnog budžeta, u prvih devet mjeseci 2024. godine u odnosu na budžet Crne Gore za 2024. godinu, po programskoj klasifikaciji:

Program	Ukupna procijenjena vrijednost projekta	Budžet 2024	Ugovorena vrijednost	Izvršenje	% izvršenja u odnosu na iznos predviđen budžetom
Infrastrukturni projekti za potrebe državnih organa	3.850.000,00	17.808,90	0,00	7.430,36	41,72%
Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa	53.000.000,00	2.101.573,50	19.189.082,56	3.211.868,47	152,83%
Javna bezbjednost	10.350.000,00	34.800,00	9.709.095,41	134.197,24	385,62%
Funkcionisanje Ministarstva odbrane i Vojske CG	47.060.000,00	7.610.000,00	25.297.789,53	2.979.466,68	39,15%
Turistička djelatnost	294.618.000,00	21.051.208,90	166.725.759,55	7.627.542,18	36,23%
Industrijski i regionalni razvoj	58.600.000,00	8.859.000,00	34.883.998,55	5.334.579,37	60,22%
Poljoprivreda	100.000,00	20.425,00	0,00	0,00	0,00%
Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja	11.480.000,00	751.727,17	10.199.871,58	1.675.898,98	222,94%
Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje	1.809.806.000,00	155.045.878,58	411.385.844,49	59.970.911,15	38,68%
Ekologija i priroda	212.541.000,00	14.109.346,97	50.833.069,02	7.477.273,78	53,00%
Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovanja	214.049.404,00	9.576.689,16	49.645.121,29	6.676.055,15	69,71%
Sport	54.850.000,00	2.299.500,00	15.120.373,35	2.658.039,08	115,59%
Razvoj nauke i tehnologije	17.800.000,00	2.110.740,00	11.992.541,10	3.476.787,17	164,72%
Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine	42.040.000,00	2.568.250,00	4.578.341,75	1.146.591,27	44,64%
Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	193.225.000,00	9.535.310,64	26.014.266,32	8.007.460,88	83,98%
Socijalna zaštita	19.880.000,00	1.320.700,00	8.836.757,21	522.048,58	39,53%
<b>Ukupno</b>	<b>3.043.249.404,00</b>	<b>237.012.958,82</b>	<b>844.411.911,71</b>	<b>110.906.150,34</b>	<b>46,79%</b>

Tabela 1 – Stepen realizacije kapitalnog budžeta  
po programskoj klasifikaciji (u eur. i %)



U nastavku je tabela kojom je predstavljeno 10 kapitalnih projekata sa najvećim iznosom opredijeljenih sredstava - izvršene u prvih devet mjeseci 2024. godine, u apsolutnom iznosu (u eur.):

Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost projekta	Budžet 2024	Ugovorena vrijednost	Izvršene	Stepen izvršenja budžeta 2024	Obrazloženje
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane	35.950.000,00	89.890,00	35.866.656,29	11.626.426,18	12934,06%	Izvođenje radova je u toku. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko - pravni odnosi.
UKP	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	20.000.000,00	15.285.001,00	20.609.890,34	6.551.890,96	42,86%	Aktivnosti na realizaciji projekata sprovede opštine. Ugovori sa opštinama su zaključeni u skladu sa iznosima koje je odobrilo MF do nivoa procijenjene vrijednosti - 20 mil. eur.
UKP	Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	32.000.000,00	5.082.000,89	24.930.470,96	4.120.908,27	81,09%	Elektroenergetska infrastruktura - UKP je nakon završetka tenderske procedure zaključila ugovore sa projektantom/izvođačem radova i stručnim nadzorom za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi". Žičara - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom po principu "projektuj i izgradi". Bazna stanica - UKP nije dostavljena dokumentacija. Ski staze - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Radovi su u toku. Putna infrastruktura - Ugovoreni radovi su završeni. Vodospajanje - Raspisano je javno nadmetanje za izradu studije, potpisan ugovor sa izabranim obrađivačem studije vodospajanja. Haube - Nakon izbora ponuđača zaključen je ugovor.
UKP	Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG	9.500.000,00	1.027.967,82	8.828.218,22	4.019.809,36	391,04%	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Doći će do produženja roka od nekoliko mjeseci zbog neusklađenosti tehničke dokumentacije sa realnim stanjem na terenu.
UZS	Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva	8.000.000,00	2.705.600,00	4.811.458,53	3.374.103,54	124,71%	Završeni radovi na investicionom presvlačenju za sekcije Kotor, Podgorica, Berane i Pljevlja, radovi u toku u sekciji Nikšić.
UKP	Naučno-tehnološki park u Podgorici	13.000.000,00	905.000,00	11.258.552,88	3.163.011,01	349,50%	Zaključeni su ugovori sa izvođačima radova i stručnim nadzorom za radove na objektu i trafostanici. Svi radovi su završeni. U toku je plaćanje po okončanoj situaciji.



Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost projekta	Budžet 2024	Ugovorena vrijednost	Izvršenje	Stepen izvršenja budžeta 2024	Obrazloženje
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nišić-Danilovgrad, dionica Jasenov polje-Vidrovan	4.800.000,00	1.797.800,00	4.707.402,30	3.105.311,12	172,73%	Izvođenje radova na predmetnoj dionici je završeno i plaćeno po okončanim situacijama.
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje-Spiljani sa sanacijom tunela i mostova	33.500.000,00	11.150.000,00	19.647.707,05	3.058.376,98	27,43%	Završeni su svi radovi na prvobitno planiranoj i ugovorenoj dionici, a u toku su pripremne radnje za raspisivanje tendera za dodatne radove shodno usvojenom zaključku skupštinskog odbora.
UKP	Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	14.500.000,00	2.112.503,56	12.998.594,36	2.543.103,48	120,38%	Radovi su završeni i objekat je predat korisniku na upotrebu. Preostala plaćanja po okončanoj situaciji.
UZS	Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina	67.800.000,00	8.425.426,68	59.352.576,35	2.507.473,48	29,76%	U toku je otklanjanje nedostataka na osnovu izvještaja komisije za tehnički pregled.

U nastavku je tabela kojom je predstavljeno 10 kapitalnih projekata sa najvećim stepenom izvršenja u prvih devet mjeseci 2024. godine, u odnosu na Zakon o budžetu za 2024. godinu (usvojen u septembru 2024. godine):

Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost projekta	Budžet 2024	Ugovorena vrijednost	Izvršenje	Stepen izvršenja budžeta 2024	Obrazloženje
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane	35.950.000,00	89.890,00	35.866.656,29	11.626.426,18	12934,06%	Izvođenje radova je u toku. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko - pravni odnosi.
UKP	Radovi na izgradnji operativnog centra	2.200.000,00	6.137,50	2.193.991,25	662.301,88	10791,07%	Radovi su završeni.





Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost projekta	Budžet 2024	Ugovorena vrijednost	Izvršenje	Stepen izvršenja budžeta 2024	Obrazloženje
UKP	Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a	4.854.404,00	17.800,00	7.204.929,28	1.441.111,46	8096,13%	Zaključeni ugovori sa izvođačem i stručnim nadzorom. U toku je izvođenje radova.
UKP	Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici	9.700.000,00	8.900,00	9.155.641,06	134.197,24	1507,83%	Završena je izgradnja kompleksa i objekti su predati korisniku na upotrebu, osim objekta magacina koji je u završnoj fazi za koji treba da se plati po okončanoj situaciji.
UKP	Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	3.670.000,00	76.500,00	3.659.900,00	645.793,83	844,17%	U periodu 2023 godine završene su sve aktivnosti na projektu, osim finalnih izvještaja, te je iz tog razloga rok produžen do 09.01.2024. godine.
UKP	Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom	900.000,00	8.900,00	732.033,06	74.574,72	837,92%	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su završeni, izuzev montaže opreme koji je naručena. Preostalo plaćanje po okončanoj situaciji.
UKP	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica	1.100.000,00	8.901,78	853.699,71	67.364,80	756,76%	Svi radovi su završeni.
UKP	Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	2.100.000,00	83.199,98	2.089.343,77	403.693,31	485,21%	Radovi su završeni.
UKP	Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG	9.500.000,00	1.027.967,82	8.828.218,22	4.019.809,36	391,04%	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Doći će do produženja roka od nekoliko mjeseci zbog neusklađenosti tehničke dokumentacije sa realnim stanjem na terenu.
UZS	Sanacija klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac-Podgorica	1.400.000,00	117.035,00	1.332.063,07	443.538,18	378,98%	Završeno izvođenje radova i isplaćene sve okončane situacije.





U nastavku je tabela kojom je predstavljeno 10 kapitalnih projekata sa najvećim ugovorene vrijednosti (u eur.):

Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost projekta	Budžet 2024	Ugovorena vrijednost	Izvršenje	Stepen izvršenja budžeta 2024	Obrazloženje
UZS	Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina	67.800.000,00	8.425.426,68	59.352.576,35	2.507.473,48	29,76%	U toku je otklanjanje nedostataka na osnovu izvještaja komisije za tehnički pregled.
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara	66.000.000,00	2.225.890,00	58.454.879,18	1.291.130,57	58,01%	U toku je izvođenje radova na trasi koji obuhvataju zemljane i betonske radove. Od juna mjeseca izvođač izvodi radove i na postavljanju cjevovoda regionalnog vodovoda.
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane	35.950.000,00	89.890,00	35.866.656,29	11.626.426,18	12934,06%	Izvođenje radova je u toku. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi.
UZS	Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, dionica Cetinje - Čevo	39.500.000,00	4.170.267,00	35.601.016,09	2.200.102,69	52,76%	Izvođenje radova je u toku. Postoje još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi.
UKP	Ski centar na lokalitetu "Kolašin", Kolašin	40.000.000,00	3.400.000,89	35.497.744,76	235.268,77	6,92%	Dva ski lifta tipa "Sidro" i "Tanjir" - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi". Rekonstrukcija Ski staze - Na prvom javnom nadmetanju nije bilo ponuda Bob na šinama - Prvo javno nadmetanje je poništeno.
UKP							Elektroenergetska infrastruktura - UKP je nakon završetka tenderske procedure zaključila ugovore sa projektantom/izvođačem radova i stručnim nadzorom za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi". Žičara - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom po principu "projektuj i izgradi". Bazna stanica - UKP nije dostavljena dokumentacija. Ski staze - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Radovi su u toku. Putna infrastruktura - Ugovoreni radovi su završeni. Vodosnabdijevanje - Raspisano je javno nadmetanje za izradu studije, potpisan ugovor sa izabranim obrađivačem studije vodosnabdijevanja. Haube - Nakon izbora ponuđača zaključen je ugovor.
UKP	Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	32.000.000,00	5.082.000,89	24.930.470,96	4.120.908,27	81,09%	



Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost projekta	Budžet 2024	Ugovorena vrijednost	Izvršenje	Stepen izvršenja budžeta 2024	Obrazloženje
UKP	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	32.000.000,00	3.010.000,89	23.222.279,57	671.325,92	22,30%	Elektroenergetska infrastruktura - zaključen ugovor za projektovanje i izgradnju trafostanice i priključnog kabla za povezivanje objekta Vizitoring centra. Ministarstvo turizma je dostavilo UT uslove i projektni zadatak za izgradnju 10kV dalekovoda sa pristupno servisnim putem i stubne trafostanice na lokalitetu Đalovića pećina. Žičara - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Objekti na ulazu u pećinu - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Putna infrastruktura - Zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom za put Gubavač - Bistrica. Radovi na ostatku trase su završeni. Vodosnabdijevanje - Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. Aktivnosti na projektovanju su obustavljene zbog stanja na terenu koje nije u skladu sa projektnim zadatkom. Vizitoring centar - Radovi na izgradnji su završeni i objekat je predat Ministarstvu. Da bi se stavio u funkciju potrebno je da se završi elektroenergetska infrastruktura.
UKP	Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	49.000.000,00	1.835.000,89	20.887.095,21	49.483,88	2,70%	Elektroenergetska infrastruktura - U toku je tenderska procedura za izgradnju dalekovoda Ribarevine - Cmiljača. Potrebno je da Ministarstvo turizma pribavi UT uslove i Projektni zadatak za kabl za povezivanje „Bazne stanice sa Cmiljačom“. Žičara i ski staze - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Bazna stanica - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Putna infrastruktura - Do sada ugovoreni radovi su završeni. U završnoj je fazi izrada projektnog zadatka koji priprema Opština Bijelo Polje. Vodosnabdijevanje - Raskinut je ugovor sa izvođačem radova zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa. UKP je izvršila dopunu projektne dokumentacije u skladu sa važećom zakonskom regulativom.



Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost projekta	Budžet 2024	Ugovorena vrijednost	Stepen izvršenja budžeta 2024		Obrazloženje
					Izvršenje	Izvršenje	
UKP	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema	20.000.000,00	15.285.001,00	20.609.890,34	6.551.890,96	42,86%	Aktivnosti na realizaciji projekta sprovode opštine. Ugovori sa opštinama su zaključeni u skladu sa iznosima koje je odobrilo MF do nivoa procijenjene vrijednosti - 20 mil. eur.
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova	33.500.000,00	11.150.000,00	19.647.707,05	3.058.376,98	27,43%	Završeni su svi radovi na prvobitno planiranoj i ugovorenoj dionici, a u toku su pripreme radnje za raspisivanje tendera za dodatne radove shodno usvojenom zaključku skupštinskog odbora.

U Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na: izradu istraživačkih radova, odnosno analitičkih informativnih materijala i sažetaka relevantnih zvaničnih domaćih publikacija i publikacija međunarodnih institucija na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, posebno u vezi sa ekonomskim i fiskalnim tendencijama u Crnoj Gori, kao i sa najznačajnijim globalnim tendencijama u oblasti ekonomije i finansija, u cilju podrške radu poslanika; saradnju sa domaćim i stranim institucijama, međunarodnim organizacijama i parlamentarnim budžetskim kancelarijama nacionalnih parlamenata i drugim srodnim službama.

Broj: 18/2024

Klas. br: 00-51-6 /24-18

Datum: novembar 2024. godine

Pripremila: Parlamentarna budžetska kancelarija

\* Parlamentarna budžetska kancelarija Skupštine Crne Gore, prilikom izrade istraživačkih radova, koristi se javno dostupnim podacima i podacima iz baza ograničenog pristupa, strogo vodeći računa o kredibilnosti izvora. Kancelarija ulaže sve razumne napore da informacije sadržane u istraživačkom radu budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za eventualnu netačnost i nepotpunost istih. Stavovi izrečeni u tekstu ne predstavljaju zvaničan stav Skupštine Crne Gore.

\*\* Svi pojmovi upotrebljeni u istraživačkom radu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.
