



Izveštaja o realizaciji kapitalnog budžeta Crne Gore za drugi kvartal 2024. godine

Povodom donošenja Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu¹, Skupština Crne Gore donijela je [Zaključak](#)², kojim zadužuje Vladu Crne Gore da kvartalno izvještava Skupštinu Crne Gore o stepenu izvršenosti i aktivnostima koje se sprovode na realizaciji kapitalnog budžeta definisanog Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu.³

Vlada Crne Gore je u januaru donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za javne investicije⁴, kojim predsjedava predsjednik Vlade Crne Gore, uz učešće resornih ministara i ključnih institucija u realizaciji kapitalnih projekata.

Vlada je u martu donijela Odluku o izradi kapitalnog budžeta⁵, koja je stupila na snagu 19. aprila 2024. godine.

Ministarstvo finansija je u prvom kvartalu pokrenulo procedure na faznoj izradi informacionog sistema za upravljanjem javnim investicijama, koji će biti sastavni dio postojeće systemske aplikacije za upravljanje budžetom (BMIS). S tim u vezi, uspostavljen je Registar kapitalnih projekata koji se finansiraju iz državnog budžeta sa pregledom trenutnog statusa implementacije.

Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2024. godinu, za kapitalni budžet opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 240,01 mil.€⁶. Sredstva su opredijeljena za realizaciju 332 projekta (aktivnosti) ukupne procijenjene vrijednosti 2,91 mlrd.€.

U prvih šest mjeseci 2024. godine za realizaciju kapitalnog budžeta Crne Gore potrošeno je 61,27 mil.€ ili 25,5% od ukupno planiranog iznosa. Od navedenog iznosa 5,7 mil.€ je plaćeno iz kredita, a 4,73 mil.€ iz EU donacija (IPA projekti)⁸. U istom periodu 2023. godine, plaćeno je 36,7 mil.€, ili 18,1% planiranih sredstava.

1 „Službeni list Crne Gore”, br. 124/23

2 „Službeni list Crne Gore”, br. 124/23; Zaključci broj 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 16 i 17 odnose se na kapitalni budžet.

3 Prvobitni Izveštaj o realizaciji Kapitalnog budžeta Crne Gore za drugi kvartal 2024. godine dostavljen je Odboru za ekonomiju, finansije i budžet 31. 07. 2024. godine (klas. br: 00-63-7/24-104). Korigovani Izveštaj dostavljen je 6. 09. 2024. godine (klas. br: 00-63-7/24-113). Navedeno je da se korekcije izvještaja odnose na ugovorene vrijednosti projekata.

4 „Službeni list Crne Gore”, br. 124/23

5 “Službeni list Crne Gore”, br. 036/24


6 Navedena sredstva opredijeljena su Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore”, br. 124/23), donesenim u decembru 2023. godine, **koji je bio važeći u izvještajnom periodu.**

7 I u prvobitno dostavljenom Izveštaju o realizaciji Kapitalnog budžeta Crne Gore za drugi kvartal 2024. godine, kao i u korigovanom Izveštaju, u tekstualnom dijelu se navodi da izvršenje kapitalnog budžeta iznosi 61.219.828,32€. U prvobitno dostavljenom Izveštaju, zbir cifara kolone „Izvršenje“ tabele u Prilogu 1 dostavljenog Izveštaja, iznosi 61.219.828,32€. U korigovanom Izveštaju o realizaciji Kapitalnog budžeta zbir cifara koji se odnosi na realizaciju svih projekata u prvoj polovini godine iznosi 61.313.638,59€. Razlika od 93.810,27€ odnosi se na Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru (Uprava za kapitalne projekte), kod kojeg je u prvobitnom Izveštaju izvršenje na nivou od 269.317,88€, dok je u korigovanom Izveštaju 363.128,15€ (kolona „Izvršenje“ tabele u Prilogu 1 Izveštaja).


8 U tekstualnom dijelu Izveštaja navodi se da je iz EU donacija (IPA) opredijeljeno 4,73 mil.€. U tabeli 1 Izveštaja o realizaciji Kapitalnog budžeta Crne Gore, kod Uprave za kapitalne projekte, izvor finansiranja, prikazno je da je iz IPA opredijeljeno 5.379.061,69€.



U nastavku su grafici koji se odnose na izvršenje kapitalnog budžeta u prvoj polovini 2024. godine i poređenje kapitalnog budžeta u odnosu na isti period 2023. godine⁹:

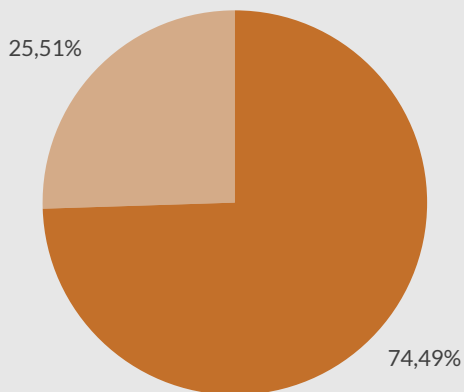

Pita grafik 1 – Odnos planirane i izvršene vrijednosti - stepen realizacije kapitalnog budžeta (%)

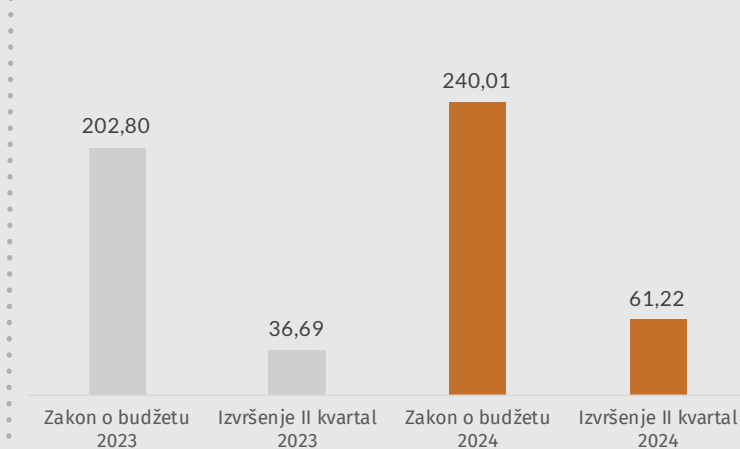


Grafik 2 – Izvršenje kapitalnog budžeta u prvih šest mjeseci 2023. i 2024. godini (u mil. eur.)

• Ministarstvo finansija je utvrđenim mjesečnim planom potrošnje za 2024. godinu planiralo realizaciju kapitalnog budžeta za obje uprave na nivou od 30% sredstava iz opštih prihoda u prvoj polovini godine, a ostatak do kraja tekuće godine, zbog specifičnosti strukture i realizacije kapitalnih projekata za koje većina faktura dopijeva na naplatu u posljednjem kvartalu fiskalne godine.

U prvih šest mjeseci 2024. godine, iz opštih prihoda budžeta je izvršeno 21% planiranih sredstva, sa sredstvima predviđenim za izgradnju Autoputa. Ukoliko se iz planiranih sredstava izuzmu sredstva predviđena za Autoput, stepen izvršenja iz opštih prihoda budžeta je 33%.

• Ugovorena vrijednost projekata iznosi 28,58% procijenjene vrijednosti projekata:

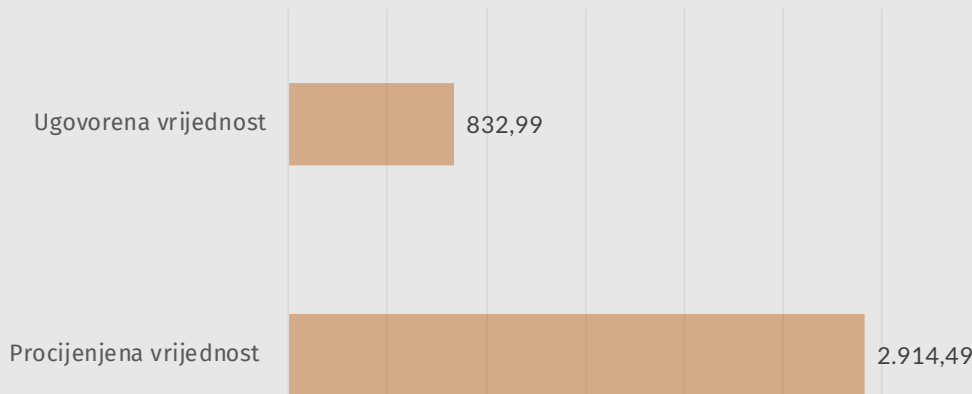

Grafik 3 – Procijenjena i ugovorena vrijednost projekata (u mil. eur.)

• Od 332 planirana projekta, kod 202 projekta, za koje je predviđeno 18,2% ukupno planiranih sredstava kapitalnog budžeta, u Tabeli 1 izvještaja izvršenje je jednako nula.

⁹ Kod grafika 2: Zakon o budžetu Crne Gore za 2023. godinu („Službeni list Crne Gore”, br. 152/22) donesen u decembru 2022. godine, i Zakon o budžetu Crne Gore za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore”, br. 124/23), donesen u decembru 2023. godine, **koji su bili važeći u izvještajnim periodima.**




Kapitalni budžet Crne Gore realizije se preko **Uprave za kapitalne projekte** i **Uprave za saobraćaj**.


U okviru kapitalnog budžeta **Uprave za kapitalne projekte**, Zakonom o budžetu za 2024. godinu, za sprovođenje 254 projekta (aktivnosti) opredijeljeno je 92 mil.€¹⁰, što predstavlja 38,5% ukupnog kapitalnog budžeta za 2024. godinu.

U prvih šest mjeseci 2024. godine za projekte koji se realizuju preko Uprave za kapitalne projekte **plaćeno je 37,26 mil.€¹¹, odnosno 40,37% ukupno planirane sume**. Iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 30,9 mil.€ ili 33% od ukupno planiranih sredstava, dok je iz kredita plaćeno 0,97 mil.€, a iz EU donacija 5,38 mil.€ (IPA projekti). U istom periodu 2023. godine, plaćeno je 17,74 mil.€, ili 13,0% planiranih sredstava.

U nastavku su grafici koji se odnose na izvršenje budžeta Uprave za kapitalne projekte u prvih šest mjeseci 2024. godine i poređenje u odnosu na isti period 2023. godine:¹²

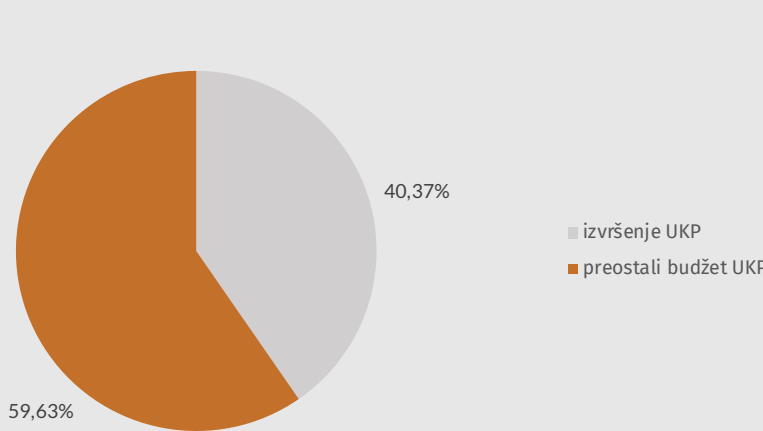

Pita grafik 4 – Stepen realizacije budžeta Uprave za kapitalne projekte (%)

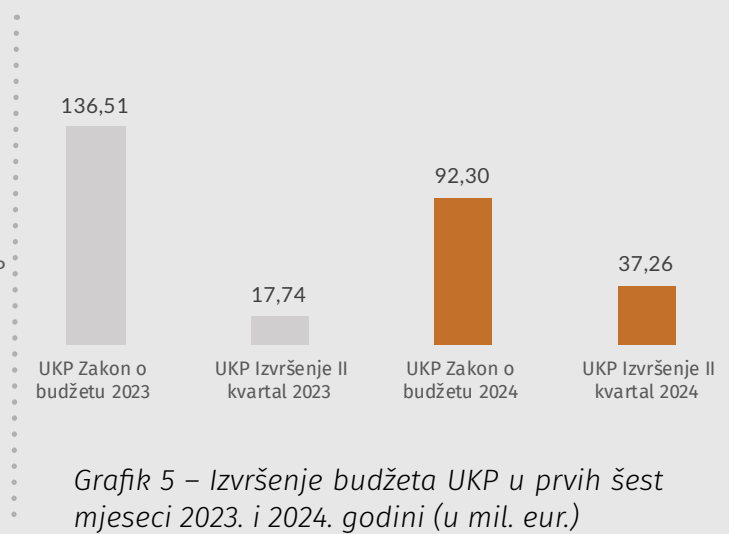

Grafik 5 – Izvršenje budžeta UKP u prvih šest mjeseci 2023. i 2024. godini (u mil. eur.)

U okviru budžeta **Uprave za saobraćaj**, Zakonom o budžetu za 2024. godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 147,7 mil.€¹³, što predstavlja 61,5% ukupnog kapitalnog budžeta za 2024. godinu. Za 77 projekata (aktivnosti) ove uprave opredijeljeno je 57,5 mil.€, dok je za Autoput Bar-Boljare, dionica Mateševo – Andrijevića opredijeljeno 90,2 mil.€.

U prvoj polovini 2024. godine, **plaćeno je 23,96 mil.€, odnosno 16,2% od ukupno planirane sume**. Od navedenog, iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 19,2 mil.€, ili 13,02% od ukupno planiranih sredstava, dok je iz kredita plaćeno 4,7 mil.€. U istom periodu 2023. godine, plaćeno je 18,95 mil.€, ili 28,59% planiranih sredstava.

U nastavku su grafici koji se odnose na izvršenje budžeta Uprave za saobraćaj u prvih šest mjeseci 2024. godine i poređenje u odnosu na isti period 2023. godine:¹⁴


¹⁰ Navedena sredstva opredijeljena su Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore”, br. 124/23), donesenim u decembru 2023. godine, koji je bio važeći u **izvještajnom periodu**.

¹¹ U Prilogu 1 dostavljenog Izvještaja, u Tabeli Uprava za kapitalne projekte – realizovane aktivnosti u prvoj polovini 2024. godine, navodi se da je ukupan zbir kolone „Izvršenje“ 37.260.499,46€. Ukupan zbir navedene kolone iznosi 37.354.309,73€, odnosno za 93.810,27€ više.


¹² Zakon o budžetu Crne Gore za 2023. godinu („Službeni list Crne Gore”, br. 152/22) donesen u decembru 2022. godine, i Zakon o budžetu Crne Gore za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore”, br. 124/23), donesen u decembru 2023. godine, **koji su bili važeći u izvještajnim periodima**.

¹³ Isto kao 10.

¹⁴ Isto kao 12

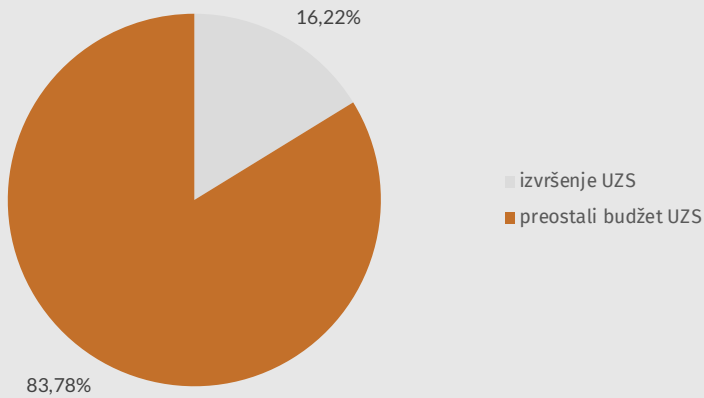

Pita grafik 6 – Stepen realizacije budžeta Uprave za saobraćaj (%)

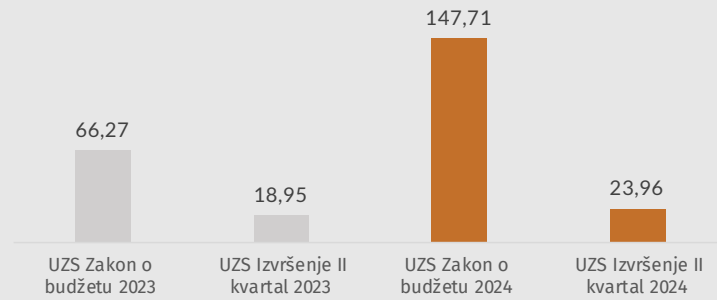

Grafik 7 – Izvršenje budžeta UZS u prvih šest mjeseci 2023. i 2024. godini (u mil. eur.)

Ukoliko se izuzmu planirana (90,24 mil.€) i plaćena (0,79 mil.€) sredstva za Autoput, izvršenje kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj iz opštih prihoda budžeta je 18,4 mil.€, što je na nivou od 32% od planiranog iznosa za ostale projekte mimo Autoputa.

Autoput Bar-Boljare

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu propisano je da će se izdaci potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita i donacija izvršavati u visini njihovog ostvarenja, kao i da je za projekat „Autoput Bar-Boljare“ planirano 90,23 mil.€ iz opštih prihoda budžeta, od čega 72,5 mil.€ za izvođenje radova namijenjenih za avansno plaćanje izabranom izvođaču za dionicu od Mateševa do Andrijevice i otklanjanje eventualnih nedostataka na prvoj dionici ukoliko za to bude potrebe.


Izgradnja će po najnovijim prognozama početi u prvom kvartalu 2025. godine, koja će se ipak većim dijelom finansirati iz EU grantova i povoljnih kreditnih aranžmana.

Izvršenje u prvoj polovini 2024. godine:

- U cilju nastavka realizacije izgradnje autoputa Bar-Boljare, „Monteput DOO“ je završio pretkvalifikacioni proces za izgradnju druge dionice od Mateševa do Andrijevice u skladu sa procedurama finansijera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). U toku je i priprema dokumentacije za pretkvalifikacioni poziv za izbor stručnog nadzora, dok će se odabir konsultanata realizovati putem direktnog javnog nadmetanja nakon što EBRD odobri dostavljenu dokumentaciju.

U nastavku je grafik koji se odnosi na izvršenje budžeta predviđenog za Autoput u prvoj polovini 2024. godine i poređenje u odnosu na isti period 2023. godine:¹⁵

Grafik 8 – Izvršenje budžeta predviđenog za Autoput u prvih šest mjeseci 2023. i 2024. godine (u mil. eur.)

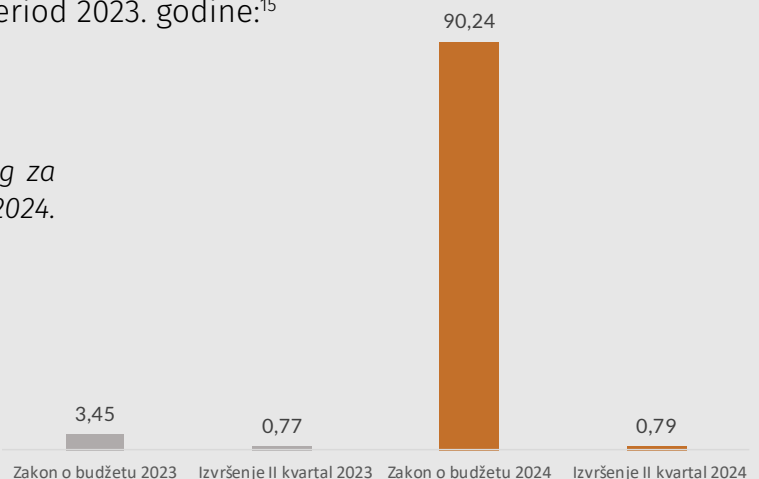

¹⁵ Zakon o budžetu Crne Gore za 2023. godinu („Službeni list Crne Gore”, br. 152/22) donesen u decembru 2022. godine, i Zakon o budžetu Crne Gore za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore”, br. 124/23), donesen u decembru 2023. godine, koji su bili važeći u izvještajnim periodima.




U nastavku je prikazano izvršenje sredstava kapitalnog budžeta, u prvih šest mjeseci 2024. godine u odnosu na usvojeni Zakon o budžetu Crne Gore za 2024. godinu, iz decembra 2023, po programskoj klasifikaciji¹⁶:

Program	Budžet 2024	Izvršenje	% izvršenja
Infrastrukturni projekti za potrebe državnih organa	0,02	0,01	41,72%
Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa	1,08	2,15	199,74%
Javna bezbjednost	0,02	0,13	753,92%
Funkcionisanje Ministarstva odbrane i Vojske CG	10,61	2,53	23,84%
Turistička djelatnost	12,35	1,64	13,27%
Industrijski i regionalni razvoj	8,50	3,67	43,18%
Poljoprivreda	0,02	0,00	0,00%
Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja	0,38	1,49	390,32%
Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje	179,01	30,98	17,31%
Ekologija i priroda	9,58	5,50	57,39%
Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovanja	5,02	3,74	74,44%
Sport	1,38	1,38	99,86%
Razvoj nauke i tehnologije	1,79	2,29	128,51%
Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine	1,62	0,68	41,78%
Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	7,63	4,61	60,34%
Socijalna zaštita	1,01	0,52	51,91%
Ukupno	240,01	61,31	25,55%

Tabela 1 – Stepen realizacije kapitalnog budžeta po programskoj klasifikaciji (u mil. eur. i %)

U nastavku je prikazan trend koji pokazuje planirani - izvršeni kapitalni budžet Crne Gore:

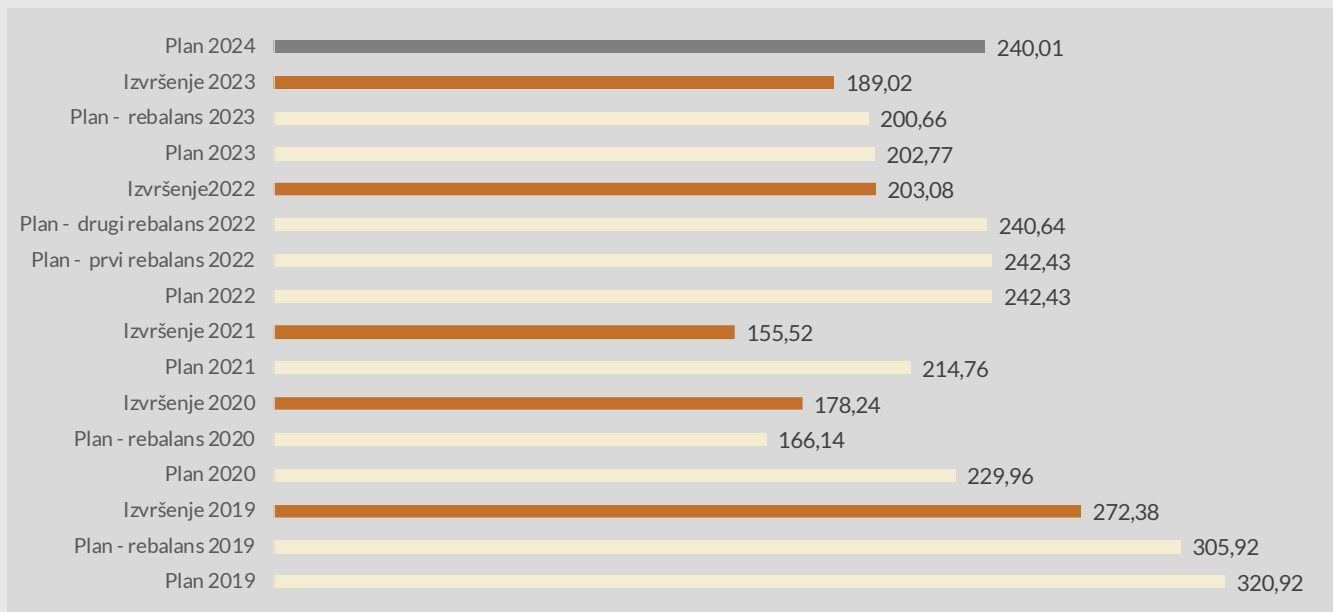

Grafik 9 – Trend planirani - izvršeni kapitalni budžet Crne Gore (u mil. €)

¹⁶ U korigovanom Izvještaju o realizaciji Kapitalnog budžeta zbir cifara kolone „Izvršenje“ tabele u Prilogu 1, u prvoj polovini godine, iznosi 61.313.638,59€.



U nastavku je tabela kojom je predstavljeno 10 kapitalnih projekata sa najvećim iznosom opredijeljenih sredstava -izvršene u prvih šest mjeseci 2024. godine, u apsolutnom iznosu (u eur.):

Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost	Budžet 2024	Izvršenje II kvartal	Stepen izvršenja Zakona o budžetu 2024	Obrazloženje
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane	35.950.000,00	35.866.656,29	89.890,00	4.728.023,97	5.259,79%	Izvođenje radova je u toku.
UZS	Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva	8.000.000,00	4.811.458,53	2.705.600,00	2.905.234,25	107,38%	Završeni radovi na investicionom presvlačenju u Kotoru, Podgorici i Beranama. Za Pljevlja i Nikšić je odabran izvođač radova, pa će se radovima pristupiti u narednom periodu.
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje-Spiljani sa sanacijom tunela i mostova	27.030.000,00	19.647.707,05	6.319.000,00	2.801.986,27	44,34%	Završeni su svi radovi i u toku je tehnički pregled.
UKP	Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	14.500.000,00	12.998.594,36	756.503,56	2.283.905,68	301,90%	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. U toku tehnički prijem objekta.
UZS	Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina	60.500.000,00	59.352.576,35	6.245.426,68	2.221.339,55	35,57%	U toku je otklanjanje nedostataka na osnovu izvještaja komsije za tehnički pregled.
UKP	Naučno-tehnološki park u Podgorici	13.000.000,00	11.252.660,18	890.000,00	2.193.287,53	246,44%	Zaključeni su ugovori sa izvođačima radova i stručnim nadzorom za radove na objektu i trafostanici. Svi radovi su završeni.
UKP	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovci, šetališta i ostalo)	20.000.000,00	27.787.547,87	15.100.001,00	2.155.712,69	14,28%	Aktivnosti na realizaciji projekata sprovede opštine. Ugovori sa opštinama su zaključeni u skladu sa iznosima koje je odobrilo MIF do nivoa procijenjene vrijednosti-20mil.eura.
UKP	Izgradnja Klinike infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG	8.280.000,00	8.828.218,22	607.967,82	1.888.056,10	310,55%	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dionica Jasenovo polje- Vidrovan	4.800.000,00	4.707.402,30	1.797.800,00	1.887.772,67	105,00%	Izvođenje radova na predmetnoj dionici je završeno.
UKP	Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici	8.500.000,00	7.314.390,10	1.246.000,00	1.474.125,04	118,31%	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su u završnoj fazi.



U nastavku je tabela kojom je predstavljeno 10 kapitalnih projekata sa najvećim stepenom izvršenja u prvih šest mjeseci 2024. godine, u odnosu na Zakon o budžetu za 2024. godinu (usvojen u decembru 2023. godine):

Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost			Budžet 2024	Izvršenje II kvartal	Stepen izvršenja Zakona o budžetu 2024	Obrazloženje
		Ugovorena vrijednost						
UKP	Radovi na izgradnji operativnog centra	500.000,00	2.193.991,25	3.137,50	393.408,12	12538,90%	Radovi su završeni.	
UKP	Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija	1.000.000,00	5.110.214,13	8.900,00	1.010.618,89	11355,27%	Zaključen ja ugovor sa stručnim nadzorom.	
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane	35.950.000,00	35.866.656,29	89.890,00	4.728.023,97	5259,79%	Izvođenje radova je u toku.	
UKP	Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici	9.700.000,00	9.155.641,06	8.900,00	134.197,24	1507,83%	Završena je izgradnja kompleksa i objekti su predati korisniku na upotrebu, osim objekta magacina koji je u završnoj fazi za koji treba da se plati po okončanoj situaciji.	
UKP	Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i uskladjivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta	3.670.000,00	3.659.900,00	76.500,00	645.793,83	844,17%	U periodu 2023. godine završene su sve aktivnosti na projektu, osim finalnih izvještaja, te je iz tog razloga rok produžen do 09.01.2024. godine.	
UKP	Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom	900.000,00	732.033,06	8.900,00	74.574,72	837,92%	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi su završeni, izuzev montaže opreme koj je naručena.	
UKP	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica	1.100.000,00	853.699,71	8.901,78	67.364,80	756,76%	Svi radovi su završeni.	
UKP	Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija	500.000,00	2.089.343,77	80.199,98	397.768,49	495,97%	Radovi su završeni.	
UKP	Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	1.700.000,00	1.659.873,74	89.000,00	363.128,15	408,01%	Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Radovi u toku.	
UKP	Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju	1.500.000,00	1.500.000,00	108.670,70	414.011,12	380,98%	Period implementacije ugovora je završen. Garantni rok je u toku.	



U nastavku je tabela kojom je predstavljeno 10 kapitalnih projekata sa najvećom procijenjenom vrijednosti (u eur.):

Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost	Budžet 2024	Izvršenje II kvartal	Stepen izvršenja Zakona o budžetu 2024	Objašnjenje
UZS	Autoput Bar-Boljare	605.000.000,00	791.067,70	90.236.000,00	791.067,70	0,88%	Pokrenut je postupak eksproprijacije. Donijeta su rješenja o zabilježbama na nepokretnostima koje su predmet postupka. U toku je saslušanje vlasnika nepokretnosti pred Upravom za nekretnine PJ Kolašin i PJ Andrijevica.
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara	66.000.000,00	58.454.879,18	2.225.890,00	0,00	0,00%	U toku je izvođenje radova na trasi koji obuhvataju zemljane i betonske radove. Od juna mjeseca izvođač izvodi radove i na postavljanju cjevovoda.
UZS	Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina	60.500.000,00	59.352.576,35	6.245.426,68	2.221.339,55	35,57%	U toku je otklanjanje nedostataka na osnovu izvještaja komsije za tehnički pregled.
UZS	Izgradnja magistralnog puta Cetinje-Cevo-Nikšić, dionica Čevo- Nikšić	58.000.000,00	420.309,99	996.800,00	0,00	0,00%	Nije bilo realizovanih aktivnosti, još uvijek nije donijet prostorni plan.
UZS	Rekonstrukcija puta Krstac - Trojice - Kotor	40.000.000,00	4.992,10	48.950,00	4.992,10	10,20%	Nije bilo aktivnosti u posmatranom periodu jer se čeka HIA studija uticaja puta na zaštićeno područje Kotora.
UKP	Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima	40.000.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00%	Ministarstvo zdravlja i Opšta bolnica Pljevija u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je sprovelo aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta. UKP je dostavljeno idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja sa predlogom za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi". Na osnovu procijenjene vrijednosti koje je odredilo Ministarstvo zdravlja, UKP je raspisala javna nadmatanja.
UKP	Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu	38.000.000,00	269.314,60	8.900,00	3.560,00	40,00%	UKP je ugovorila izradu i reviziju tehničke dokumentacije trafostanice i vodosnabdijevanja objekta zatvora i završila izradu i reviziju projektne dokumentacije regulacije korita Tare. Obaveza Opštine MK je putna infrastruktura. Ministarstvo pravde je ugovorilo izradu projektne dokumentacije objekta, za koju je UKP ugovorila posao razvije.



Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost	Budžet 2024	Izvršenje II kvartal	Stepen izvršenja Zakona o budžetu 2024	Obrazloženje
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta Kolašin- Mojkovac	38.000.000,00	307.674,42	925.600,00	8.598,00	0,93%	U toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.
UKP	Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici	38.000.000,00	307.010,78	8.900,00	0,00	0,00%	Ministarstvo zdravlja i KCCG u saradnji sa Ministarstvom ekologije je sprovelo aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog bloka. Nakon što UKP bude dostavljeno idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta Nikšić - Podgorica, dionica tunel "Budeš" - Danilovgrad	37.000.000,00	226.028,00	1.343.900,00	24.200,00	1,80%	Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.

U nastavku je tabela kojom je predstavljeno 10 kapitalnih projekata sa najvećim iznosom ugovorene vrijednosti (u eur.):

Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost	Budžet 2024	Izvršenje II kvartal	Stepen izvršenja Zakona o budžetu 2024	Obrazloženje
UZS	Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina	60.500.000,00	59.352.576,35	6.245.426,68	2.221.339,55	35,57%	U toku je otklanjanje nedostataka na osnovu izvještaja komisije za tehnički pregled.
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara	66.000.000,00	58.454.879,18	2.225.890,00	0,00	0,00%	U toku je izvođenje radova na trasi koji obuhvataju zemljane i betonske radove. Od juna mjeseca izvođač izvodi radove i na postavljanju cjevovoda.
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane	35.950.000,00	35.866.656,29	89.890,00	4.728.023,97	5259,79%	Izvođenje radova je u toku.
UZS	Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, dionica Cetinje - Čevo	35.700.000,00	35.601.016,09	2.670.267,00	1.009.430,54	37,80%	Izvođenje radova je u toku.



Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost	Budžet 2024	Izvršenje II kvartal	Stepen izvršenja Zakona o budžetu 2024	Obrazloženje
UKP	Ski centar na lokalitetu "Kolašin "	35.000.000,00	35.000.744,76	1.335.000,89	7.012,75	0,53%	Dva Ski lifta tipa "Sidro" i "Tanjir"- Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom po principu "projektuj i izgradi". Rekonstrukcija Ski staze - Na prvom javnom nadmetanju nije bilo ponuda Bob na šinama - Prvo javno nadmetanje je poništeno.
UKP	Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo)	20.000.000,00	27.787.547,87	15.100.001,00	2.155.712,69	14,28%	Aktivnosti na realizaciji projekata sprovede opštine. Ugovori sa opštinama su zaključeni u skladu sa iznosima koje je odobrilo MiF do nivoa procijenjene vrijednosti-20mil.e.
UKP	Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	25.000.000,00	23.222.279,57	1.335.000,89	26.257,00	1,97%	Elektroenergetska infrastruktura - zaključen ugovor za projektovanje i izgradnju trafostanice i priključnog kabla za povezivanje objekta Vizitoring centra. Ministarstvo turizma je dostavilo UT uslove i projektni zadatak za izgradnju 10KV dalekovoda sa pristupno servisnim putem i stubne trafostanice na lokalitetu Đalovića pećina. Žičara - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Objekti na ulazu u pećinu i unutrašnjost pećine - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Putna infrastruktura - Zaključeni su ugovori sa izvođačem i nadzorom za put Gubavač - Bistrica. Radovi na ostatku trase su završeni. Vodosnabdijevanje - Zaključeni su ugovori sa obrađivačem i revidentom projektne dokumentacije. Aktivnosti na projektovanju su obustavljene zbog stanja na terenu koje nije u skladu sa projektnim zadatkom. Vizitoring centar- Radovi na izgradnji su završeni i objekat je prdat Ministarstvu. Da bl se stavio u funkciju potrebno je da sa završi elektroenergetska infrastruktura.



Potrošačka jedinica	Aktivnost	Procijenjena vrijednost	Ugovorena vrijednost	Budžet 2024	Izvršenje II kvartal	Stepen izvršenja Zakona o budžetu 2024	Objašnjenje
UKP	Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	28.000.000,00	20.887.095,21	1.335.000,89	36.958,77	2,77%	U toku je tenderska procedura za izgradnju dalekovoda Ribarevine-Cmiljača. Potrebno je da Ministarstvo turizma pribavi UT uslove i Projektni zadatak za kabl za povezivanje „Bazna stanica“ sa "Cmiljačom". Žičara i ski staze - Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Bazna stanica-Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom. Putna infrastruktura - Do sada ugovoreni radovi su završeni. U završnoj je fazi izrada projektnog zadatka koji priprema Opština Bijelo Polje. Vodospajanje koje je priprema Opština Bijelo Polje. Vodospajanje koje je priprema Opština Bijelo Polje. Vodospajanje koje je priprema Opština Bijelo Polje. - Raskinut je ugovor sa izvođačem radova zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
UKP	Ski centar na lokalitetu "Hajla", Rožaje	20.000.000,00	20.000.470,96	1.780.000,89	760.546,91	42,73%	Elektroenergetska infrastruktura - Nakon što je UKP krajem decembra 2022. godine dostavio potpisan Projektni zadatak od strane nadležnog Ministarstva turizma, UKP je nakon završetka tenderske procedure zaključila ugovore sa projektantom/izvođačem radova i stručnim nadzorom za realizaciju projekta po principu "projektuj i izgradi". Žičara -Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom po principu "projektuj i izgradi". Bazna stanica - UKP nije dostavljena dokumentacija - Ski staze- Zaključeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom. Radovi su u toku. Putna infrastruktura - Ugovoreni radovi su završeni. Vodospajanje - Raspisano je javno nadmetanje za izradu studije, potpisan ugovor sa izabranim obrađivačem studije vodospajanja. Haube - nakon izbora ponuđača zaključen je ugovor.
UZS	Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova	27.030.000,00	19.647.707,05	6.319.000,00	2.801.986,27	44,34%	Završeni su svi radovi i u toku je tehnički pregled.



Preusmjerenja sredstava kapitalnog budžeta u 2024. godini:

Vlada Crne Gore je razmotrila informacije o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu **Uprave za kapitalne projekte** za 2024. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte **u okviru ove uprave**: na sjednici od 4. aprila 2024. godine i donijela [Zaključke](#) o preusmjeranju sredstava u iznosu od **8,5 mil.€**; na sjednici od 24. maja i donijela [Zaključke](#) o preusmjeranju u iznosu od **2,09 mil.€**; na sjednici od 11. jula i donijela [Zaključke](#) o preusmjeranju u iznosu od **5,42 mil.€**. Vlada Crne Gore je razmotrila Informaciju o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu **Uprave za saobraćaj** za 2024. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte **u okviru ove uprave**: na sjednici od 17. maja i donijela [Zaključke](#) o preusmjeranju u iznosu od **2,2 mil.€**.

Broj: 15/2024

Klas. br: 00-51-6 /24-15

Datum: novembar 2024. godine

Pripremila: Parlamentarna budžetska kancelarija

* Parlamentarna budžetska kancelarija Skupštine Crne Gore, prilikom izrade istraživačkih radova, koristi se javno dostupnim podacima i podacima iz baza ograničenog pristupa, strogo vodeći računa o kredibilnosti izvora. Kancelarija ulaže sve razumne napore da informacije sadržane u istraživačkom radu budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za eventualnu netačnost i nepotpunost istih. Stavovi izrečeni u tekstu ne predstavljaju zvaničan stav Skupštine Crne Gore.

** Svi pojmovi upotrebljeni u istraživačkom radu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

U Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na: izradu istraživačkih radova, odnosno analitičkih informativnih materijala i sažetaka relevantnih zvaničnih domaćih publikacija i publikacija međunarodnih institucija na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, posebno u vezi sa ekonomskim i fiskalnim tendencijama u Crnoj Gori, kao i sa najznačajnijim globalnim tendencijama u oblasti ekonomije i finansija, u cilju podrške radu poslanika; saradnju sa domaćim i stranim institucijama, međunarodnim organizacijama i parlamentarnim budžetskim kancelarijama nacionalnih parlamenata i drugim srodnim službama.

Poseban doprinos u formiranju Parlamentarne budžetske kancelarije pružila je Vestminsterska fondacija za demokratiju uz podršku Ambasade Velike Britanije u Podgorici, u sklopu projekta „Jačanje finansijskog nadzora Skupštine Crne Gore“ (2016-2018), koji je imao za cilj stvaranje stručnog jezgra koje će omogućiti Skupštini Crne Gore da značajnije učestvuje u budžetskom ciklusu, a poslanicima da imaju na raspolaganju podršku prilikom analize i rasprave o ključnim budžetskim dokumentima i zakonima sa značajnim fiskalnim uticajem.

Kancelarija je formirana i započela je sa radom oktobra 2020. godine, kao uža organizaciona jedinica Parlamentarnog instituta, u okviru Sektora za istraživanje, dokumentacione poslove i istraživačku mrežu Skupštine Crne Gore. Novim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore, donesenim u julu 2021. godine, Kancelarija je izdvojena kao samostalna organizaciona jedinica.
